



infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH  
Lister Straße 17  
30163 Hannover

Tel.: 0511 / 35 77 98-0

[www.infra-hannover.de](http://www.infra-hannover.de)


Christian Weske

Geschäftsführer


# Gesamtzeitplan und Projektablauf ZEHNSIEBZEHN



Rahmenterminplan ZEHNSIEBZEHN Abschnitte 1 bis 4

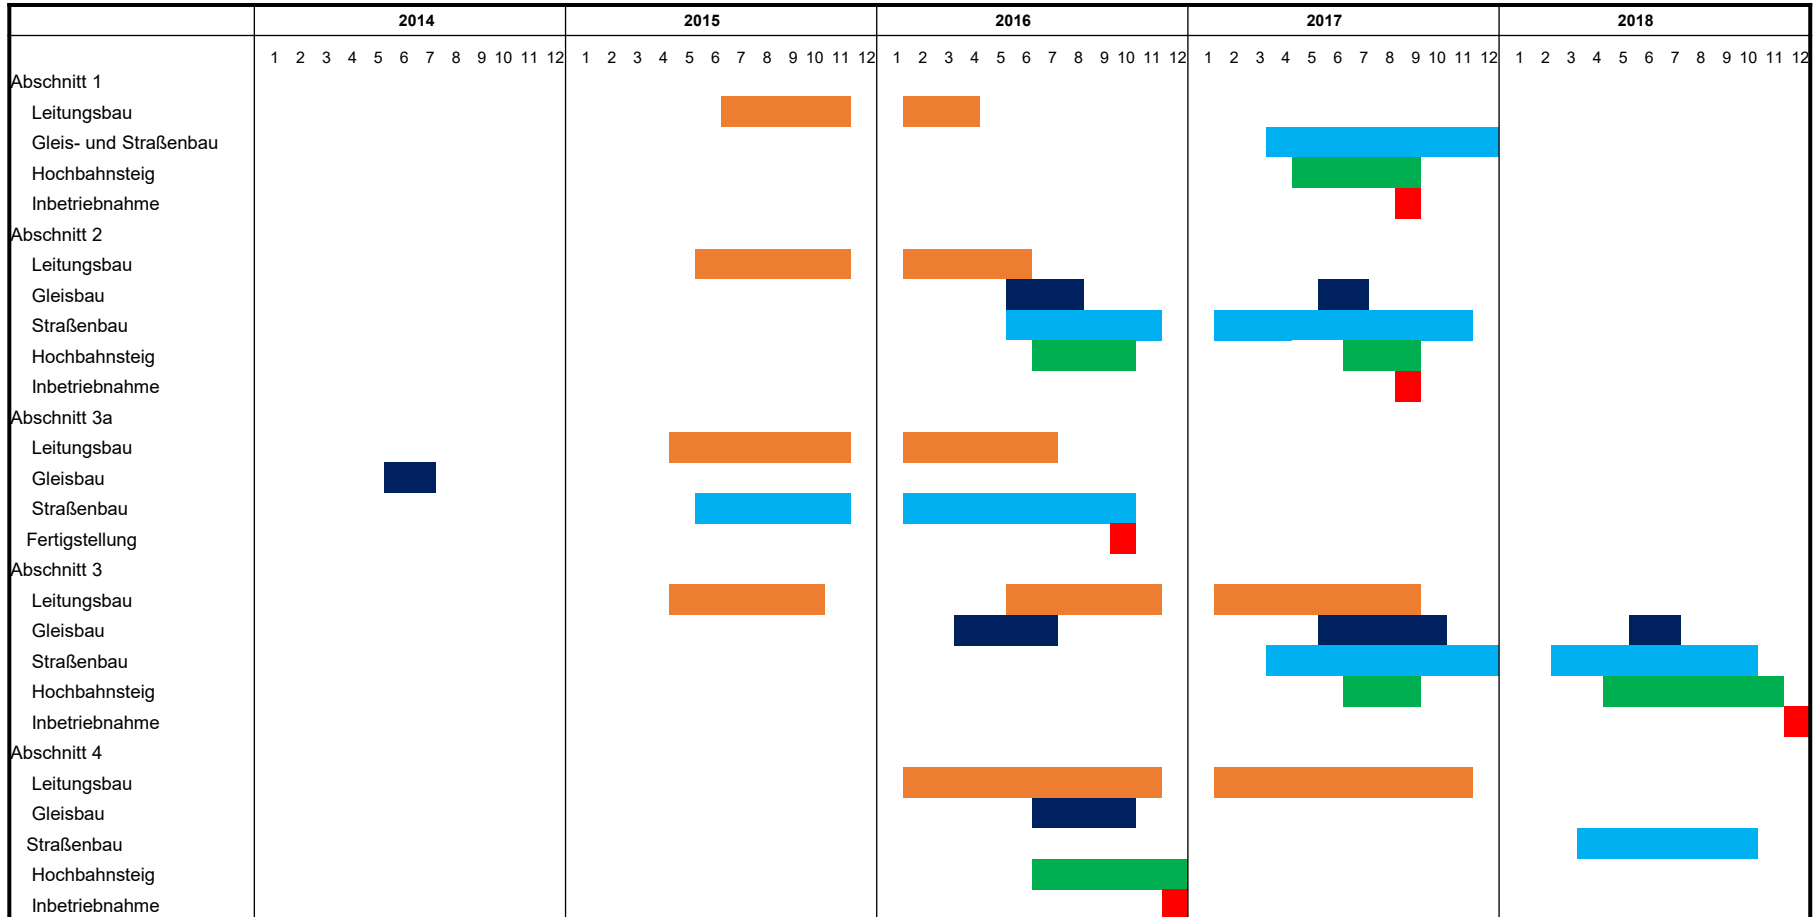

# Zeitplan ZEHNSIEBZEHN Bauabschnitt 5

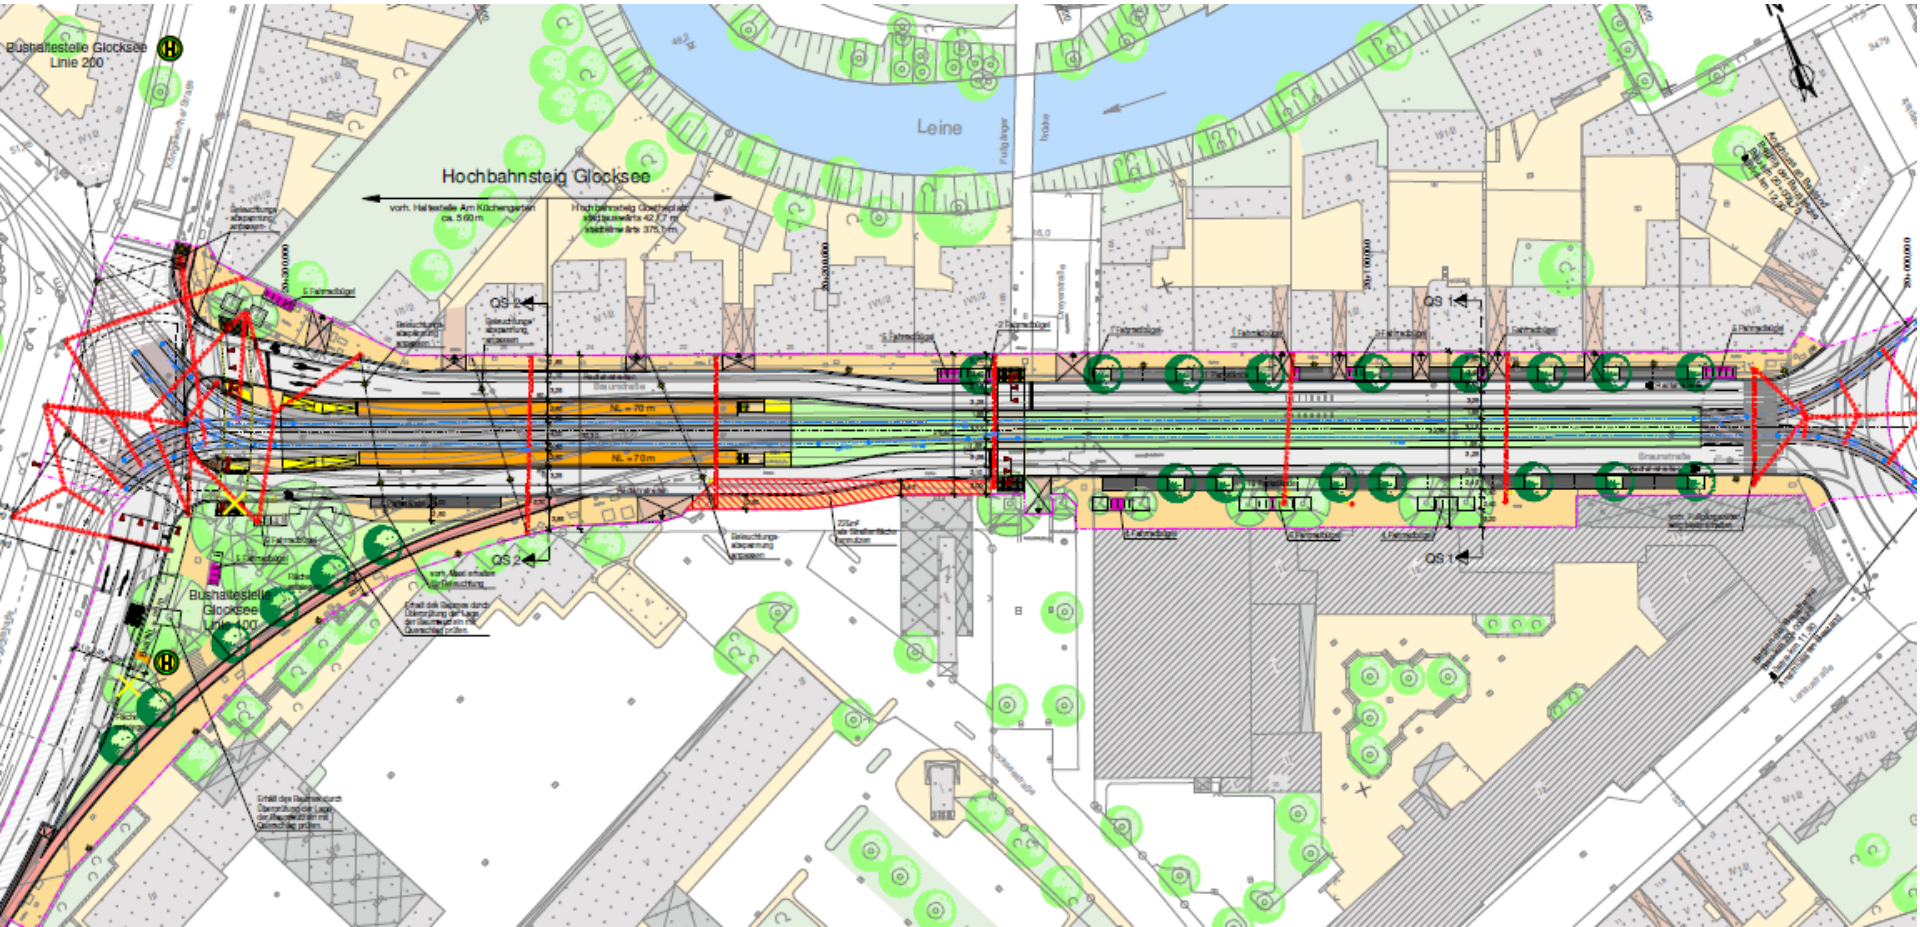

- 1. öffentliche Auslegung: Abschnitte 3-5 gemeinsam vom 05.01 – 04.02.2015 (hier Seitenhochbahnsteige)
- Ende der Einwendungsfrist Träger öffentlicher Belange 22.03.2015
- Einwendungen sichten und Stellungnahmen bearbeiten: April 2015
- Entscheidung, dass wegen Änderungswünschen der politischen Gremien der LHH eine Planänderung durchgeführt wird. Juni 2015 (2. Rampe mit Signalisierung)
- Umplanung bis zur finalen Zustimmung aller Beteiligten am 11.8.2016
- Fertigstellung geänderter Planfeststellungsunterlagen Dezember 2016

→ **Umplanung hat zu 2 Jahren Zeitverzug geführt**




- 2. öffentliche Auslegung: 9.2.2017 bis 8.3.2017
- Planfeststellungsbeschluss: 20.11.2017
- Rechtskraft Planfeststellungsbeschluss 21.12.2017
- Finanzierungsantrag beim Land Niedersachsen: 31.5.2018
- Programmaufnahme: Februar 2019
- Beginn Ausschreibungen: März 2019

→ **Baubeginn nicht vor Mitte 2019 möglich**



- Baubeginn Leitungsbau August 2019
- Verlegung Fernwärme und Regenwasserkanal bis August 2020
- Baubeginn Gleis- und Straßenbau Oktober 2020
- Gleis und Straßenbau bis Mitte 2022
- Inbetriebnahme Hochbahnsteig Ende 2021

Rahmenterminplan ZEHNSIEBZEHN Abschnitt 5

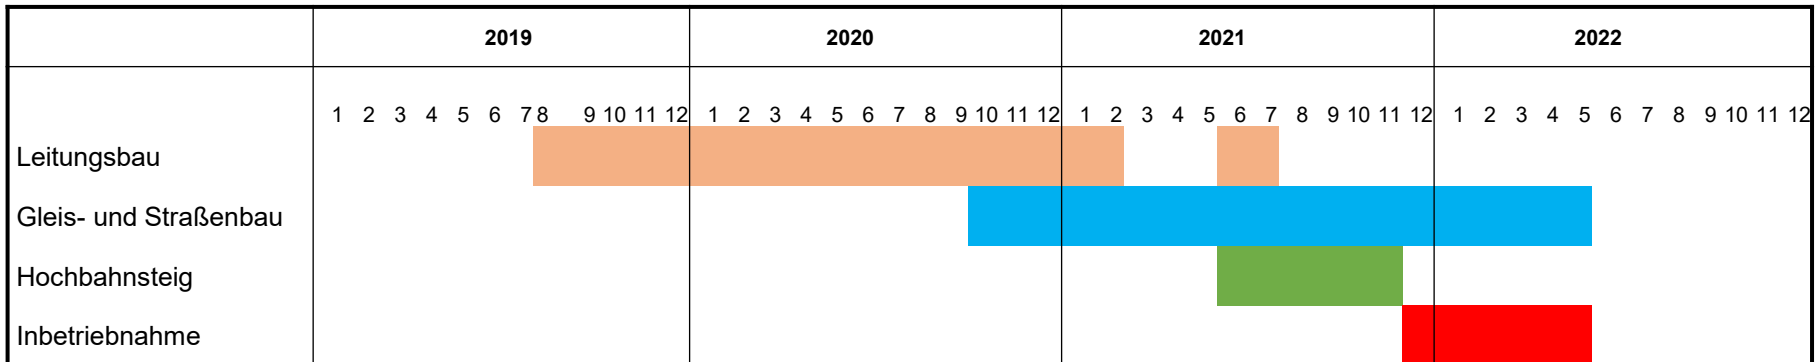





infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH  
Lister Straße 17  
30163 Hannover

Tel.: 0511 / 35 77 98-0

[www.infra-hannover.de](http://www.infra-hannover.de)
