Rahmenterminplan
VORABZUG

pbr Planungsbüro Rohling AG
Architekten und Ingenieure

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Prüfung HU-Bau**	**17,5 Tage**	**Mi 24.09.08**	**Fr 17.10.08**
6	**Genehmigungsverfahren**	**74 Tage**	**Fr 17.10.08**	**Do 29.01.09**
13	**Planung, Ausschreibung, Vergabe und Montage Provisorien**	**199 Tage**	**Fr 14.11.08**	**Do 20.08.09**
24	**Ausführungsplanung**	**200 Tage**	**Fr 14.11.08**	**Fr 21.08.09**
30	**Vergabe**	**180 Tage**	**Fr 06.03.09**	**Fr 13.11.09**
37	**Baudurchführung**	**698,5 Tage**	**Do 20.08.09**	**Di 24.04.12**
38	Baubeginn	0 Tage	Fr 18.09.09	Fr 18.09.09
39	**BA1 Umzug/ Abbruch**	**46 Tage**	**Do 20.08.09**	**Fr 23.10.09**
43	**BA 1 (San. HG/AU)**	**165 Tage**	**Fr 23.10.09**	**Fr 11.06.10**
46	**BA2 Umzug/ Abbruch**	**30 Tage**	**Fr 14.05.10**	**Fr 25.06.10**
49	**BA 2 (Neubau Klassentrakt)**	**155 Tage**	**Fr 25.06.10**	**Fr 28.01.11**
53	**BA3 Umzug/ Abbruch**	**30 Tage**	**Fr 31.12.10**	**Fr 11.02.11**
56	**BA 3 (San. IGS List)**	**155 Tage**	**Fr 11.02.11**	**Fr 16.09.11**
61	**BA4 Umzug/ Abbruch**	**30 Tage**	**Fr 19.08.11**	**Fr 30.09.11**
64	**BA 4 (Neubau Sporthalle)**	**132,5 Tage**	**Fr 30.09.11**	**Di 03.04.12**
69	**BA 5 (Rückbau BE / restl. Außenanl.)**	**45 Tage**	**Mi 22.02.12**	**Di 24.04.12**
73	Fertigstellung	0 Tage	Di 24.04.12	Di 24.04.12
74				
75	**Ferien Niedersachsen 2009**	**185 Tage?**	**Mo 02.02.09**	**Sa 17.10.09**
76	Winterferien	2 Tage?	Mo 02.02.09	Di 03.02.09
77	Osterferien	13 Tage?	Mo 30.03.09	Mi 15.04.09
78	Pfingsten	8 Tage?	Fr 22.05.09	Di 02.06.09
79	Sommerferien	30 Tage?	Do 25.06.09	Mi 05.08.09
80	Herbstferien	10 Tage?	Mo 05.10.09	Sa 17.10.09
81	Weihnachtsferien	11 Tage?	Do 24.09.09	Do 08.10.09
82	**Ferien Niedersachsen 2010**	**133 Tage?**	**Mo 01.02.10**	**Mi 04.08.10**
83	Winterferien	2 Tage?	Mo 01.02.10	Di 02.02.10
84	Osterferien	13 Tage?	Fr 19.03.10	Di 06.04.10
85	Pfingsten	8 Tage?	Fr 14.05.10	Di 25.05.10
86	Sommerferien	30 Tage?	Do 24.06.10	Mi 04.08.10
87	**Ferien Niedersachsen 2011**	**30 Tage?**	**Do 07.07.11**	**Mi 17.08.11**
88	Sommerferien	30 Tage?	Do 07.07.11	Mi 17.08.11

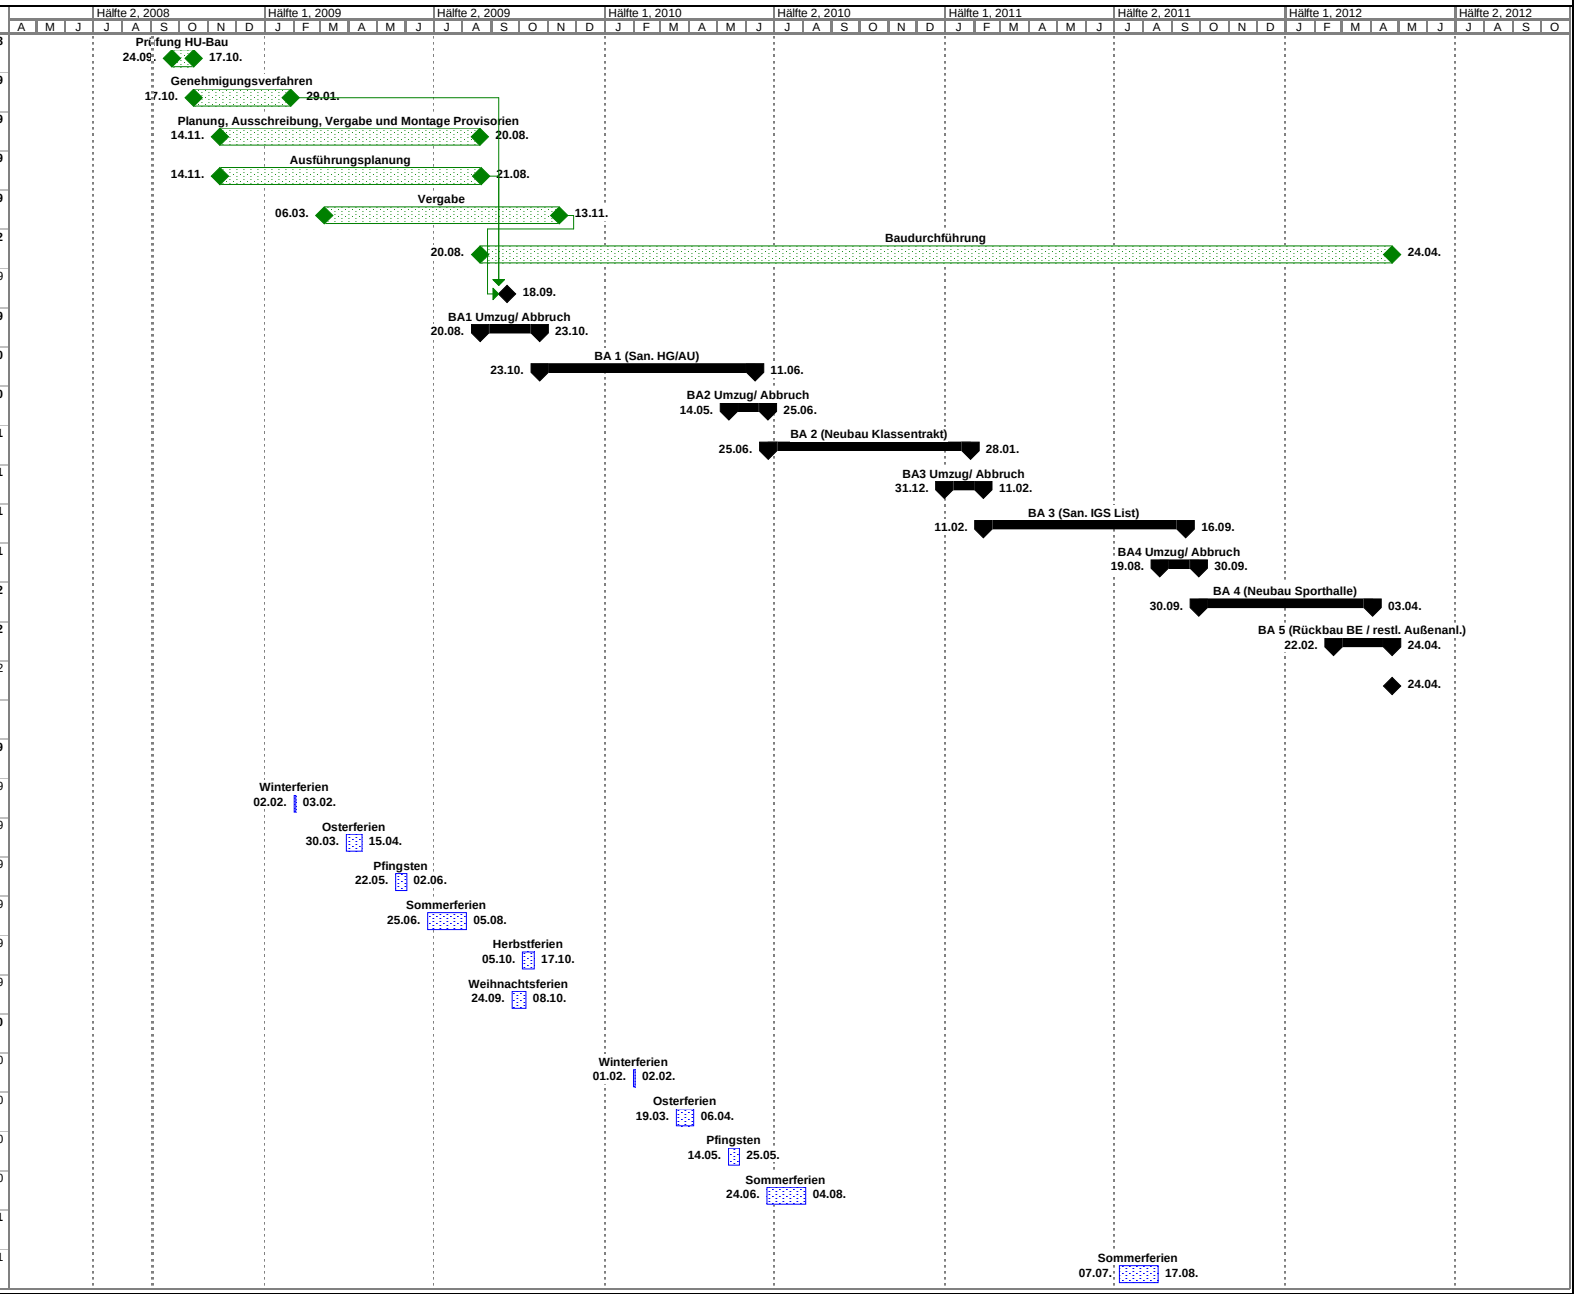

Aufgestellt: pbr(plu)
Stand: Di 02.09.08
